


沉箱工支架(沉箱海上續打用)

適用於沉箱海上續打用支架組裝撤除。

1. 價目表製作順序

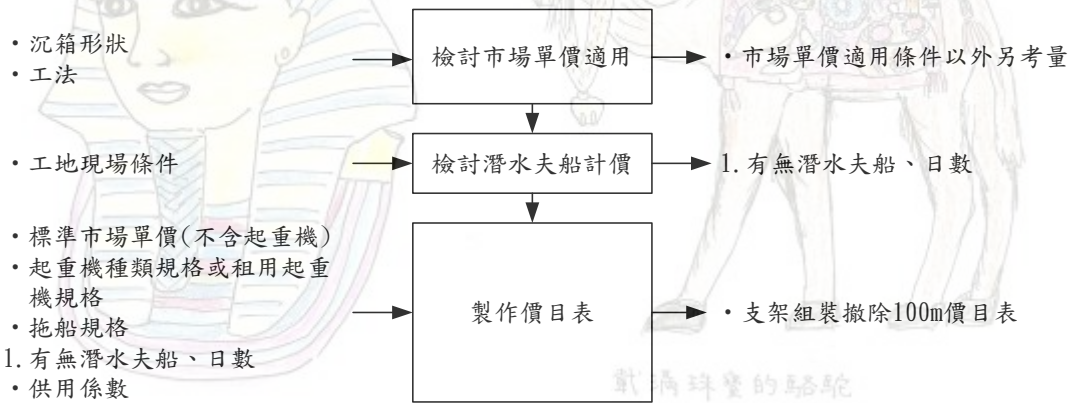


2. 市場單價

2011 埃及尼羅河之旅

3. 單價表

4. 施工標準作業日數(價目表)

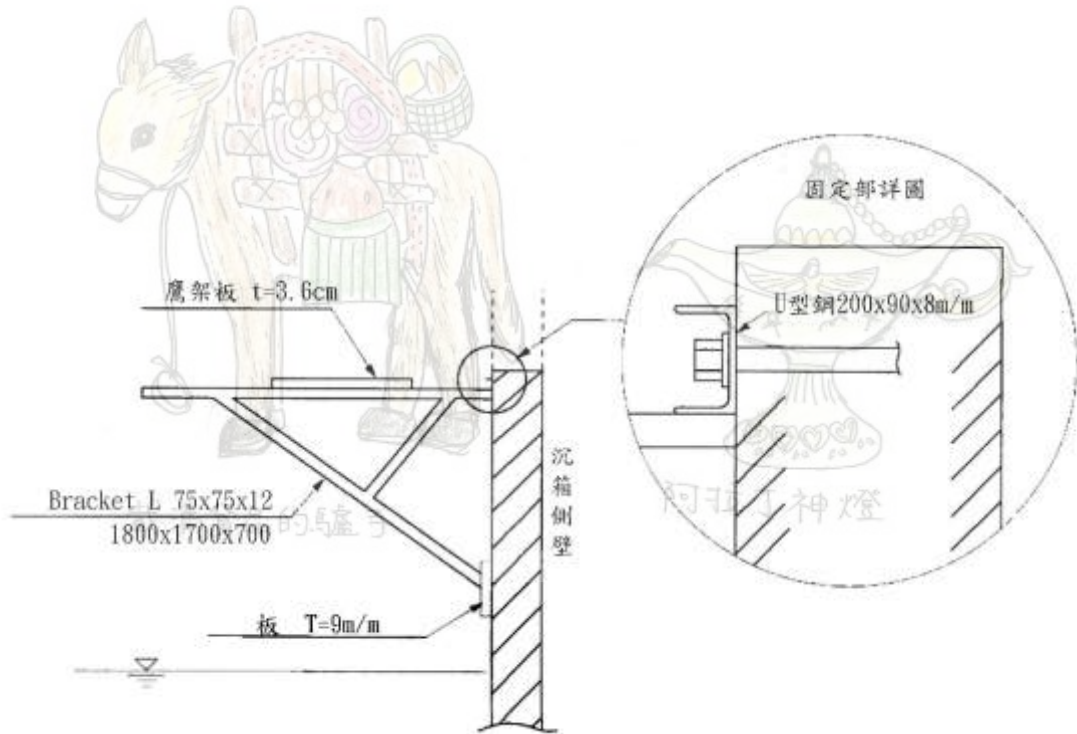

支架組裝撤除 100m

| 名稱 | 形狀 尺寸 | 單位 | 數量 | | | 備註 |
|-------------------|------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | 陸上 起重機 | 租用 起重機 | 海上 起重機 | |
| 支架組裝撤除 | 無起重機 | m | 100 | | | 市場單價 |
| 輪胎式或履帶式 起重機 | (油) 噸吊 | 日 | 2.2 | - | - | 標準運轉時間 |
| 租用起重機 運轉費 | 噸吊 | 日 | - | 2.2- | - | |
| 起重駁船 或 起重機船 | 噸吊 非航回轉鋼 D 噸吊 | 日 | - | - | 2.2 | 運轉 6 小時 勤務 8 小時 |
| 拖 船 運轉 | 鋼 D PS 型 | 日 | - | - | 2.2 | 運轉 2 小時 勤務 8 小時 |
| 潛水夫船 運轉 | D1800PS 型 3~5 噸吊 | 日 | | | | 勤務 8 小時 |

- 註 1. 起重機種類規格依沉箱工起重機種類及規格
 2. 租用起重機運轉費計價必要費用
 3. 隨工地現場條件，可計價潛水夫船
 4. 依工地現場條件必要追加起重機時，可另行計價起重機費用
 5. 支架結構以上圖所示為標準，不同結構時另行檢討。



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

回港灣工程施工

回港灣工程估價
